

**INFORME DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS
EJERCICIO FISCAL 2014**

**MEJORAMIENTO CALLE 1ERA. CALLE, MANZANA A, SECTOR
CENTRAL**

No.	DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CANTIDAD CONTRATADA	UNIDAD	P.U.	TOTAL CONTRATADO	EJECUTADO
1	Perfilado (0.10 m. de espesor)	1100	M ²	Q 34.50	Q 37,950.00	1100
2	Nivelación capa asfalto	20	Ton-M.	Q 565.72	Q 11,314.40	NO SE EJECUTÓ (DOC. DE CAMBIO 1 -OC-)
3	Material bituminoso	273	Gls.	Q 42.75	Q 11,670.75	NO SE EJECUTÓ (DOC. DE CAMBIO 1 -OC-)
4	Pavimento de concreto hidraulico (4,000 PSI)	220	M ³	Q 2,010.00	Q 442,200.00	220
5	Cajas y cabezales	6	U	Q 1,525.00	Q 9,150.00	3
6	Corte de concreto	825	MI.	Q 42.95	Q 35,433.75	825
7	Bordillo de concreto	200	MI.	Q 150.00	Q 30,000.00	200
DOCUMENTO DE CAMBIO No. 2 (ACUERDO DE TRABAJO EXTRA 1)						
8	Suministro y aplicación pintura termoplástica (lineal central y laterales) ATE 1	350	MI.	Q 29.50	Q 10,325.00	350
9	Suministro y aplicación pintura termoplástica (pasos de cebra) ATE	32	MI.	Q 125.19	Q 4,006.08	32
10	Suministro e instalación de marcadores reflectivos (vialetas) ATE	53	U.	Q 23.19	Q 1,229.07	53
11	Suministro y aplicación de pintura para tráfico (para bordillos) ATE 1	200	MI.	Q 60.00	Q 12,000.00	200

Los renglones 2,3 y 5, fueron ajustados en **Orden de Cambio No. 1 (OC No. 1, Decremento)**, autorizada por Gerencia General mediante **ACUERDO GG. STC. No. 0028-2014**. Los renglones del 8 al 11, fueron incluidos en **Acuerdo de Trabajo Extra (ATE)** autorizado por Gerencia General mediante **ACUERDO GG. STC. No. 0029-2014**.

CALLE ANTES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO



INICIO DE TRABAJOS

Medición inicial para la verificación de anchos y longitudes de calle previo al inicio de la ejecución del renglón de perfilado.



PERFILADO DE CALLE

Estos trabajos consisten en el perfilado de asfalto deteriorado con máquina fresadora para la trituración y remoción del material a sustituir.





PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 4,000 PSI

Consiste en la construcción de pavimento de concreto de cemento portland, con espesor de 0.20 m. de 4,000 psi de resistencia con sistema de losas cortas de 1.80 x 1.80 con cortes de juntas, sin barras de transferencia.





CAJAS Y CABEZALES PARA ALCANTARILLAS DE CONCRETO CICLÓPEO

Este renglón consistió en la reparación de las cajas y elevación de brocales de las cajas ajustando a la altura de la nueva rasante de la calle pavimentada, se construyeron y colocaron tapaderas de concreto reforzado.

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 3-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6°. Nivel, Oficina 603
Tels.: 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
K m. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal
Guatemala C.A. Tels.: 7948-3015, 3032, 7960-0225 fax: 7948-3414

www.zolicguate.com




BORDILLOS

Este renglón consistió en la construcción de 200 metros lineales de bordillo de una dimensión de 0.40 x 0.15m. con concreto de 2,500 PSI.



CORTE DE CONCRETO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN

Estos trabajos consistieron en el corte del concreto en secciones cortas de 1.80 x 1.80 en ambos sentidos a un tercio de profundidad del espesor del concreto.

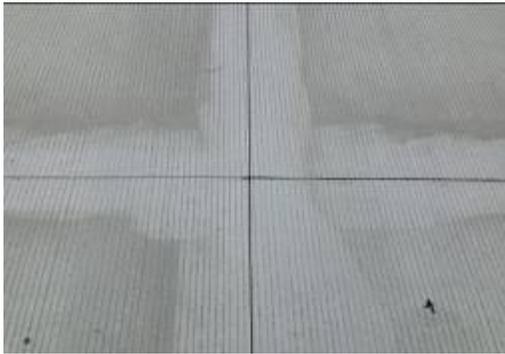

APLICACIÓN DE SELLADOR EN CORTE DE JUNTAS DE DILATACIÓN

Esta actividad consistió en la aplicación de un sellador de Asfalto Tipo IV para sellar los cortes en las juntas de dilatación del concreto



FOTOS CALLE TERMINADA PREVIO A LA SEÑALIZACIÓN



SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Los trabajos de señalización horizontal consistieron en la aplicación de pintura termoplástica, líneas dobles color amarillo al centro y de color blanco las líneas laterales, se colocaron vialetas, se pintaron pasos de cebras para el paso de peatones y pintura de bordillos laterales de color amarillo.





Ejecución física: 100%.

MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA DE LA PRIMERA CALLE HASTA LA SALIDA DE LA ZONA LIBRE, MANZANA A, SECTOR CENTRAL

4TA. AVENIDA, DE LA PRIMERA CALLE HASTA LA SALIDA DE ZOLIC, MANZANA A, SECTOR CENTRAL							
CONTRATO ORIGINAL							
No.	DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CANTIDAD CONTRATADA	UNIDAD	OC 1 (DECREMENTAR A CANTIDAD CONTRATADA)	OTS 1 (INCREMENTAR A CANTIDAD CONTRATADA)	CANTIDADES AJUSTADAS APLICANDO LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS (OC, OTS Y ATE)	EJECUTADO AL 18/06/2014
1	Perfilado (0.10 m. de espesor) OC1	2250	M ²	82		2168	2168
2	Nivelación capa asfalto OTS1	90	Ton-M.		2	92	92
3	Material bituminoso OTS1	1100	Gs.		25	1125	1125
4	Pavimento de concreto hidráulico (4,000 PSI) OC1	450	M ³	16		434	434
5	Cajas y cabezales OC1	14	U	8		6	6
6	Corte de concreto OTS1	2000	MI.		257	2257	2257
7	Bordillo de concreto OC1	530	MI.	204		326	326
ATE 1 ADICIONAL A RENGLONES DEL CONTRATO INICIAL							
8	Suministro y aplicación pintura termoplástica (lineal central y laterales)	602	MI.				602
9	Suministro e instalación de marcadores reflectivos (vialetas)	112	U.				112
10	Suministro y aplicación de pintura para tráfico (para bordillos)	326	MI.				326
11	Suministro y Aplicación de pintura termoplástica para túmulos (ATE 1)	12	M ²				12

Los documentos modificatorios fueron autorizados por Gerencia General mediante **Acuerdos de Gerencia 0047-2014, 0048-2014 y 0049-2014** de fecha 10.06.2014.

CALLE ANTES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO



INICIO DE TRABAJOS



PERFILADO DE CALLE



NIVELACIÓN DE CAPA DE ASFALTO



OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 3-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6°. Nivel, Oficina 603
Tels.: 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
K m. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal
Guatemala C.A. Tels.: 7948-3015, 3032, 7960-0225 fax: 7948-3414

www.zolicguate.com



PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 4,000 PSI






CAJAS Y CABEZALES PARA ALCANTARILLAS DE CONCRETO CICLÓPEO





BORDILLOS

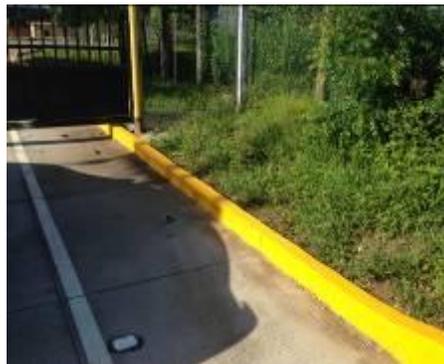

CORTE DE CONCRETO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN



APLICACIÓN DE SELLADOR EN CORTE DE JUNTAS DE DILATACIÓN

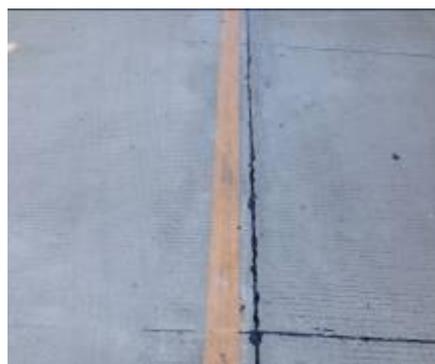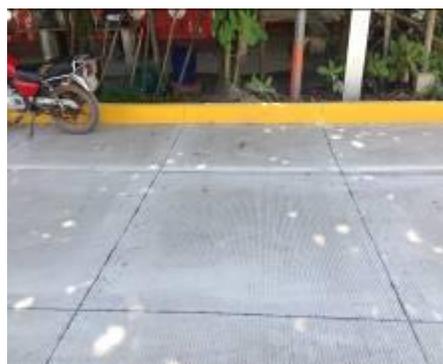



SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL



